N°	Mode Tâche	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	Prédécesseurs
1						
2		Installation de chantier	2 jours	Lun 05.02.24	Mar 06.02.24	
3						
4		Protections divers.	6 jours	Mer 07.02.24	Mer 14.02.24	2
5						
6		Ponçage des bétons	28 jours	Mer 07.02.24	Ven 15.03.24	2DD+2 jours
7						
8		Contrôle de la structure	25 jours	Lun 19.02.24	Ven 22.03.24	4DD+8 jours
9						
10		Piquage et évacuation des gravats des zone déjà éclatées.	25 jours	Lun 19.02.24	Ven 22.03.24	6DD+8 jours
11						
12		Lavage ponctuel et traitement de fers	30 jours	Lun 25.03.24	Ven 03.05.24	10FD-10 jours
13						
14		Reconstruction des zones piquées (Coffrage au besoin)	38 jours	Lun 25.03.24	Mer 15.05.24	12DD
15						
16		OC2 - Travaux d'ancrage aux parapets	15 jours	Mar 23.04.24	Lun 13.05.24	
17						
18		Protection avant inhibiteur	5 jours	Mar 14.05.24	Lun 20.05.24	14FD-2 jours
19						
20		Mise en place d'un inhibiteur de corrosion	9 jours	Mar 21.05.24	Ven 31.05.24	18
21						
22		Protection avant lavage au karcher	5 jours	Jeu 13.06.24	Mer 19.06.24	24DD-5 jours
23						
24		Lavage au karcher (délai après application inhibiteur)	2 jours	Jeu 20.06.24	Ven 21.06.24	20FD+13 jours
25						
26		mise en place de l'enduit de protection	13 jours	Mar 25.06.24	Jeu 11.07.24	24FD+1 jour
27						
28		Mise en place des joints	4 jours	Mar 09.07.24	Ven 12.07.24	26FD-3 jours
29						
30		Divers et finition	84 jours	Mer 07.02.24	Sam 01.06.24	2
31						
32		Nettoyage	3 jours	Jeu 11.07.24	Lun 15.07.24	28FD-2 jours

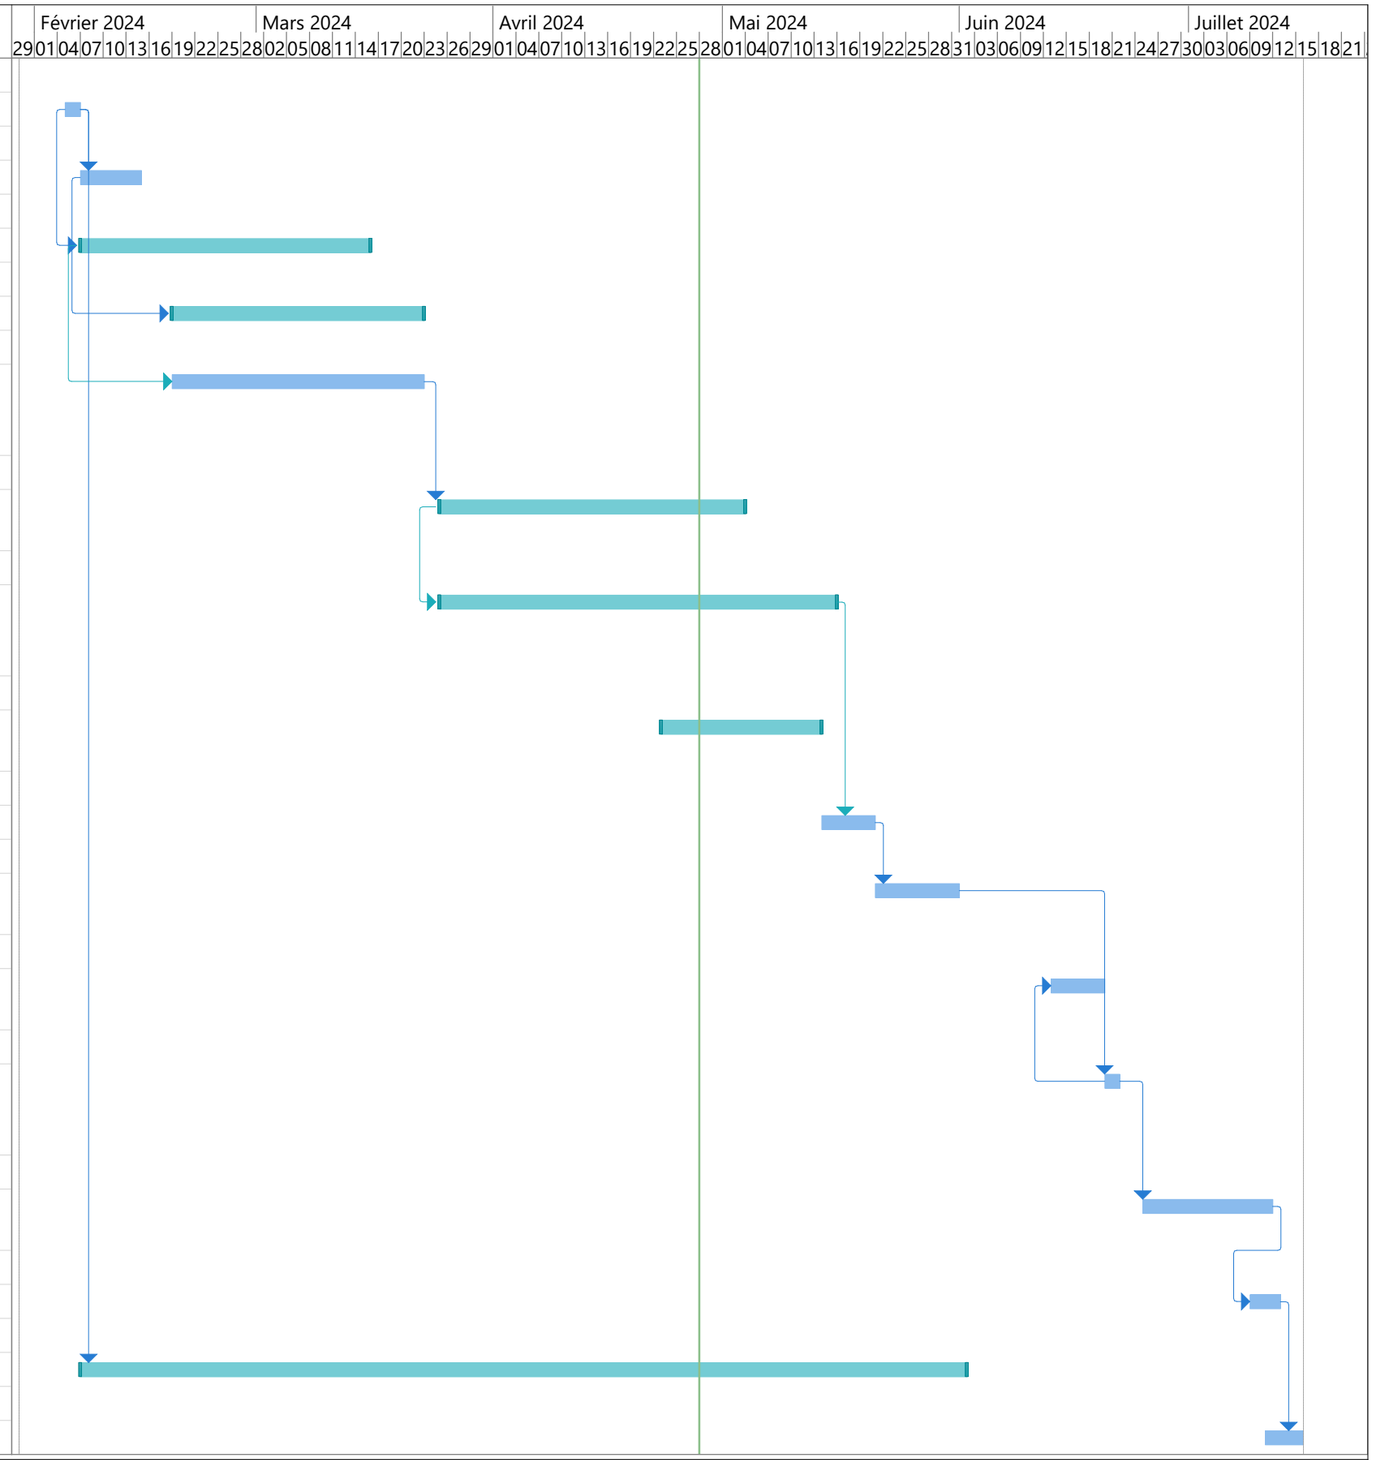

Projet : Côte 50-60 Morges.
Date : Dim 28.04.24

Tâche	Récapitulatif du projet	Tâche manuelle	Début uniquement	Échéance
Fractionnement	Tâche inactive	Durée uniquement	Fin uniquement	Avancement
Jalon	Jalon inactif	Report récapitulatif manuel	Tâches externes	Progression manuelle
Récapitulative	Récapitulatif inactif	Récapitulatif manuel	Jalons externes	
